

立法會環境事務委員會 工程項目簡介

382DS號工程計劃 —
清水灣道、碧水新村及西貢西郊污水收集系統

背景


- 財務委員會於本年6月核准272DS號工程計劃的一部分和273DS號工程計劃的一部分提升為甲級，成為382DS，用以在清水灣道、碧水新村及西貢西郊進行污水收集系統工程
- 按付款當日價格計算，工程計劃的核准預算費為2億9,060萬元


目的

提高382DS工程計劃的核准預算費，由2億9,060萬元增加至3億5,900萬元（按付款當日價格），共提高6,840萬元

工程內容

- 在11個未敷設污水渠的地方敷設長約12.8公里的污水渠
- 在順緻街至碧翠路之間和在碧水新村附近敷設長約3.6公里的無壓污水幹渠
- 在碧水新村興建一所污水泵房
- 在碧水新村和沿清水灣道近井欄樹和白石窩的部分路段敷設長約900米的雙管壓力污水管

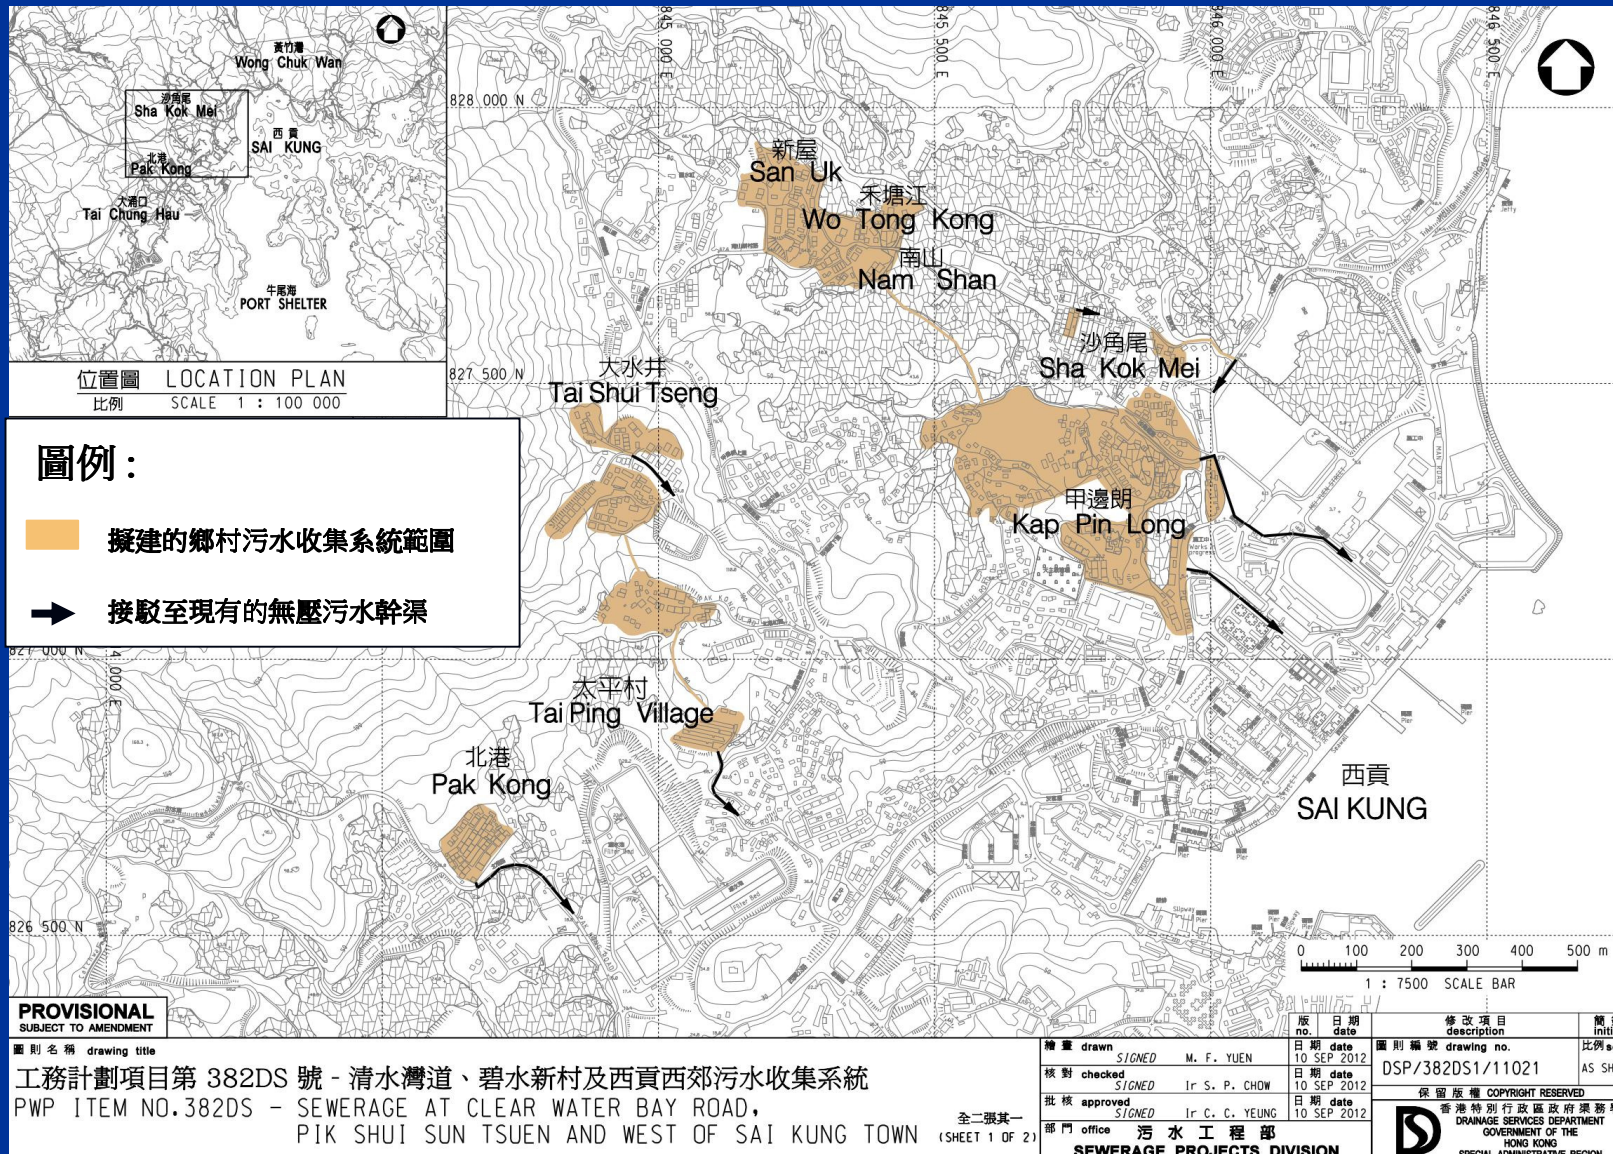

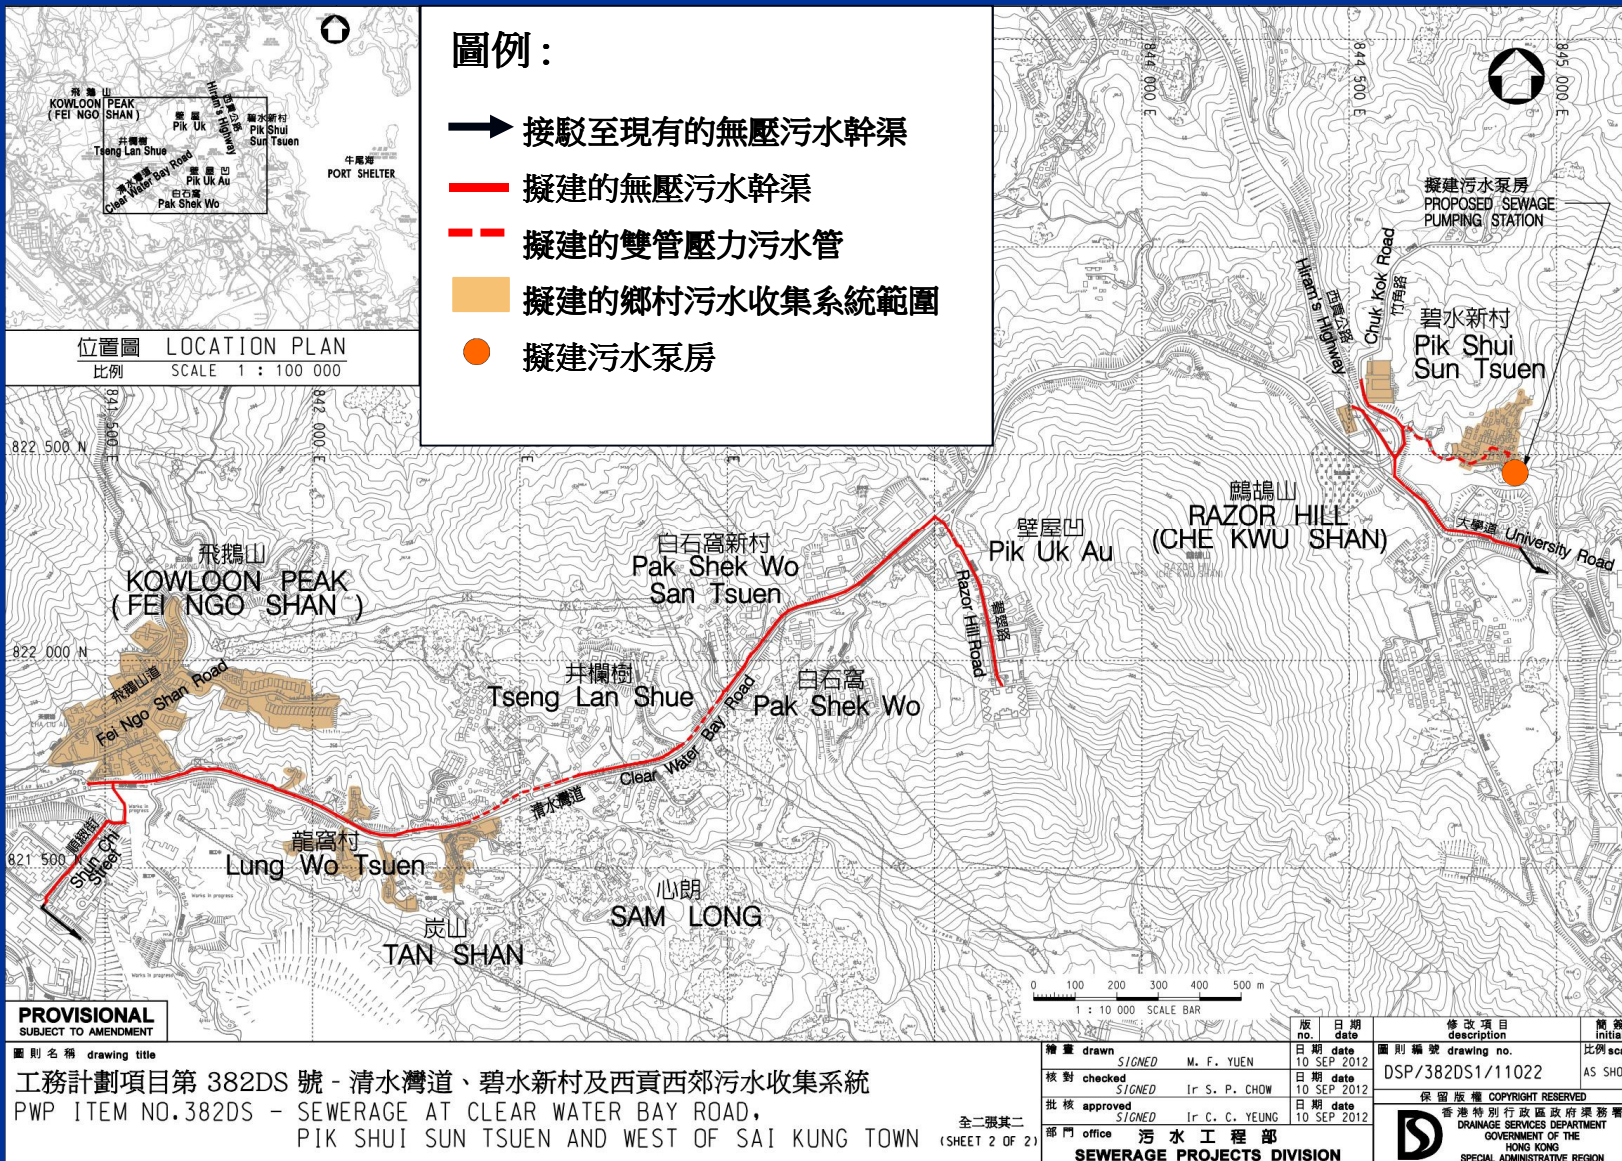

最新情況

- 兩份工程合約落實382DS號工程計劃
 - 第一份合約涵蓋敷設污水渠及污水泵房的土木工程
 - 第二份合約涵蓋污水泵房中的機電設施
- 剛完成了第一份合約的標書評審。在檢討382DS號工程計劃的財政狀況後，我們建議在批出合約前，提高382DS號工程計劃的核准預算費。

提高核准預算費的理由

- 投標報價高於預期
 - 在多山丘及擠迫的西貢鄉村地區出入困難
 - 沿清水灣道的掘路交通限制甚多
- 增加價格調整準備

對財政的影響

建議增加工程計劃的核准預算費（按付款當日價格），其分項數字如下：

因素	按付款當日價格計算的費用增幅 (百萬元)
增加原因—	
(a) 投標報價高於預期	59.7
(b) 增加價格調整準備的撥款	19.2
(c) 應急費用	(10.5)
總計	68.4

推行計劃

如獲財委會批准撥款，我們的目標是於2013年1月展開建造污水收集系統的工程，以期於2017年1月竣工。

敬請各委員支持

謝謝
